KELOMPOK 6



WBS , GANTT CHART , PERT WEBSITE KASIR KEDAI TAKOSAI

DOSEN : LULU CHAERANI MUNGGARAN

MK : PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

ROLE ANGGOTA KELOMPOK



Daffa Naufal Arafi

System Analyst



Daniela Costantina Pattirane

Programmer



Rafi Hanifa Fikri

PIC/Project Lead




Voni Febriyanti Helena

Designer

METODE PENGEMBANGAN

Metode Prototype adalah model pengembangan sistem yang berfokus pada pembuatan versi awal atau contoh (prototype) dari sistem yang akan dikembangkan. Prototype ini kemudian diuji dan dievaluasi oleh pengguna untuk mendapatkan masukan sebelum sistem final dibangun. Model ini dipilih dalam pengembangan Website Kasir Kedai Takosai karena memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap kebutuhan pemilik usaha dan pengguna. Melalui pendekatan ini, tim dapat memahami kebutuhan secara lebih akurat, memperbaiki desain atau fitur berdasarkan umpan balik langsung, serta memastikan sistem akhir benar-benar sesuai dengan alur kerja kasir dan kebutuhan operasional di lapangan.

Work Breakdown Structure

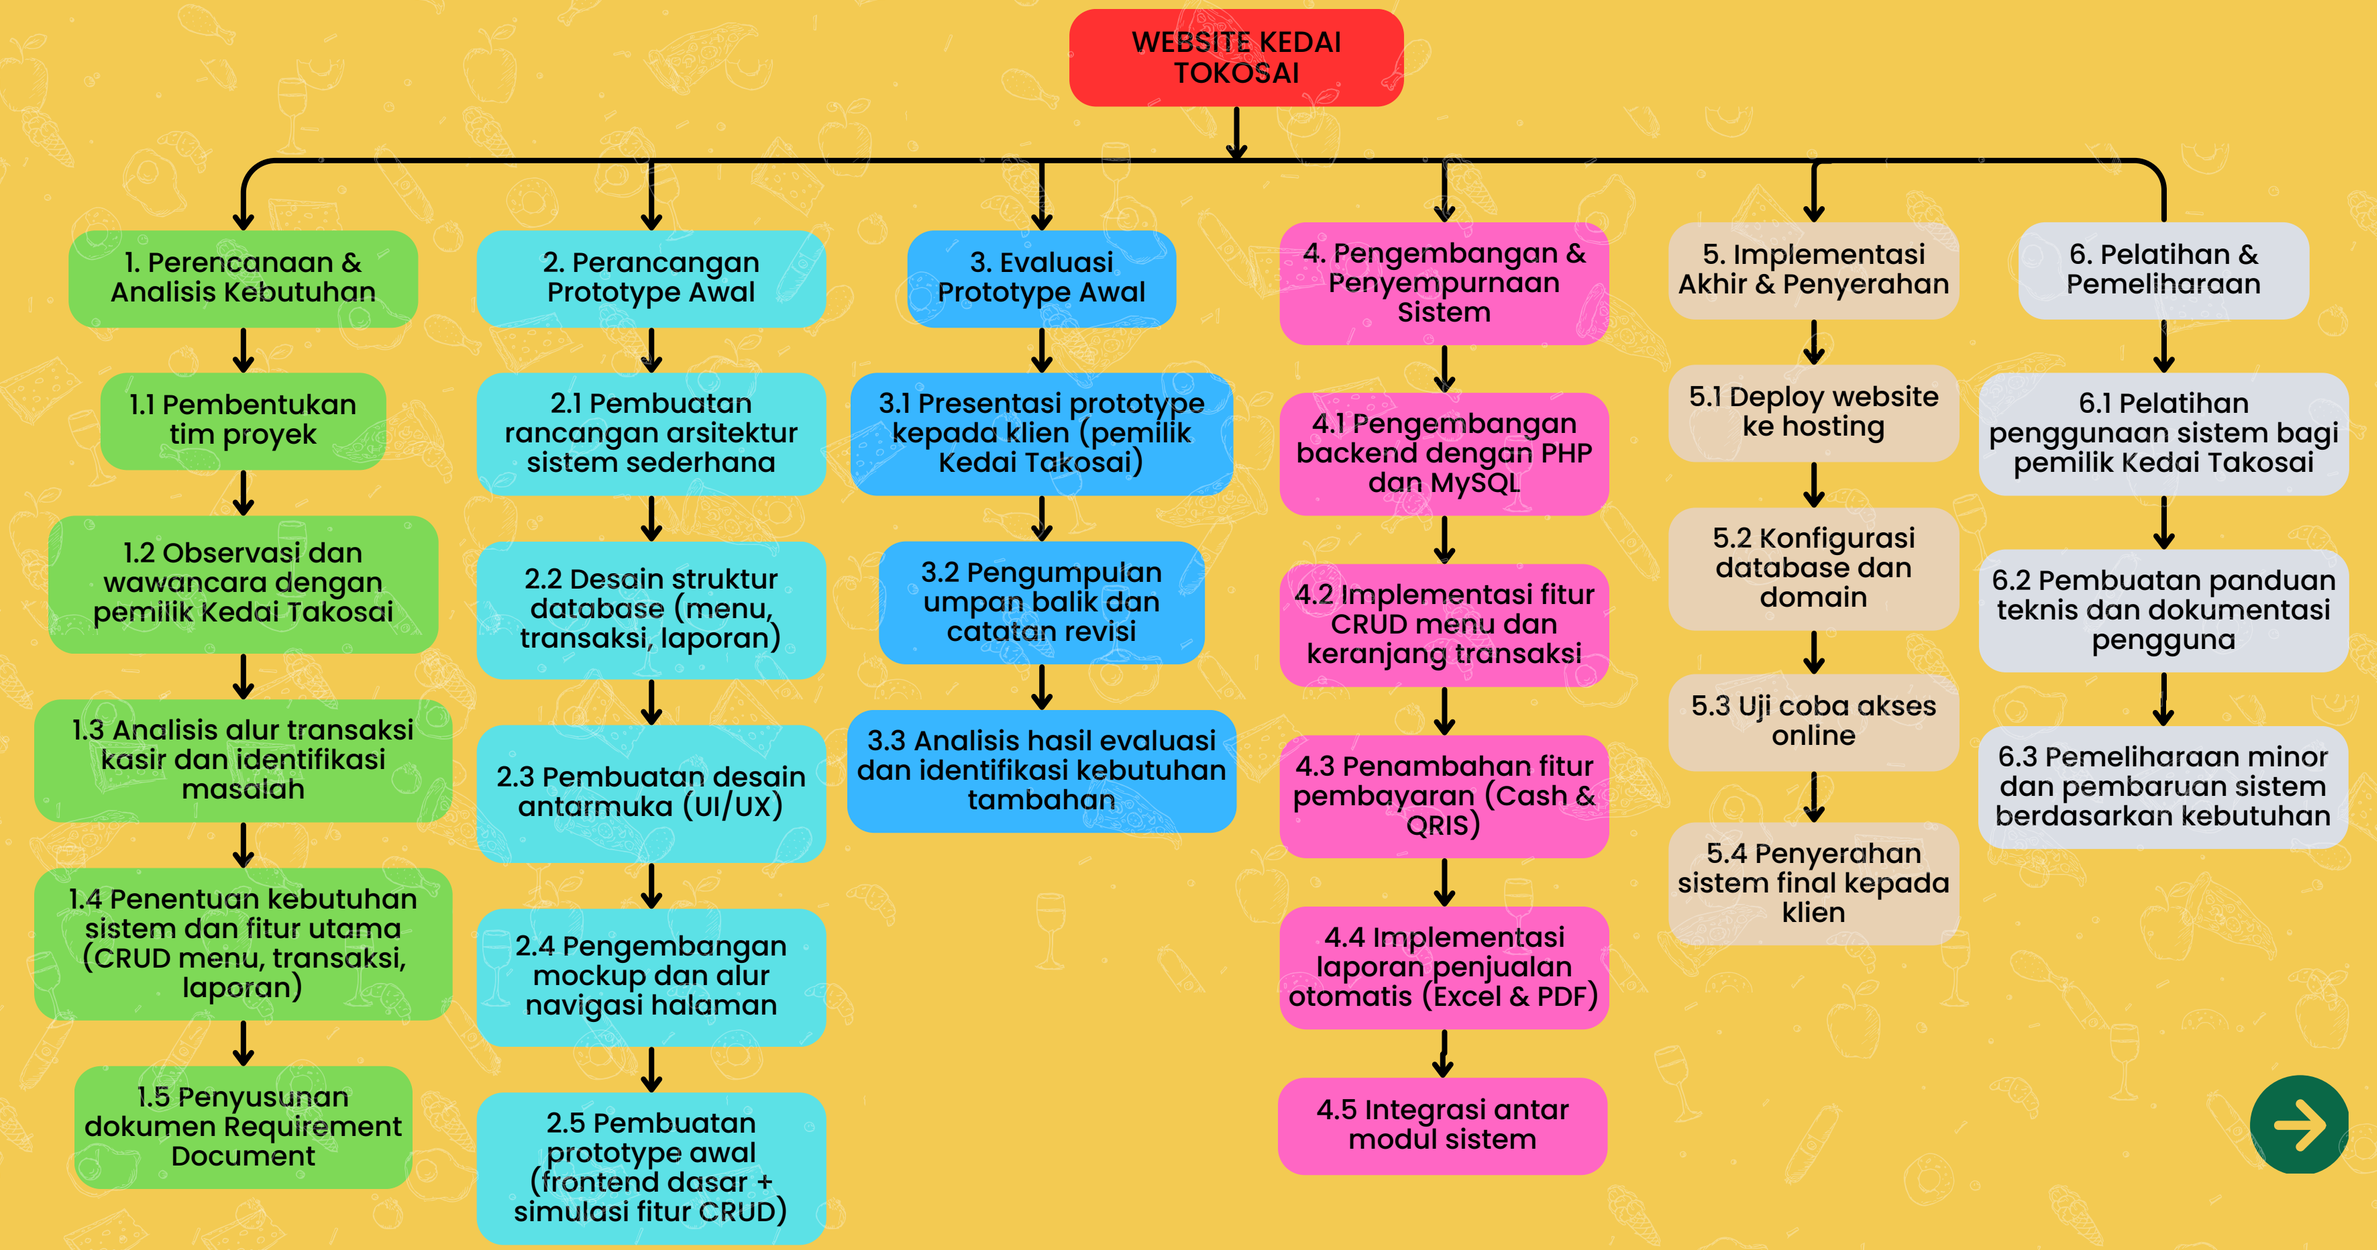

GANTT CHART

Tahapan Kegiatan		PIC	BULAN OKTOBER																	
			1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Tahapan Kegiatan	1.1 Pembentukkan Tim Proyek	RAFI																		
	1.2 Observasi dan wawancara dengan pemilik Kedai Tokasai	RAFI																		
	1.3 Analisis alur transaksi kasir dan identifikasi masalah	RAFI																		
	1.4 Penentuan kebutuhan sistem dan fitur utama (CRUD menu, transaksi, laporan)	DAFFA																		
	1.5 Penyusun dokumen Requiment Document	DAFFA																		

Tahapan Kegiatan		PIC	BULAN OKTOBER							BULAN NOVEMBER								
			21	22	23	24	25	26	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. Perancangan Prototype Awal	2.1 Pembuatan rancangan arsitektur sistem sederhana	DAFFA																		
	2.2 Desain struktur database (menu, transaksi, laporan)	DAFFA																		
	2.3 Pembuatan desain antarmuka (UI/UX)	VONI																		
	2.4 Pengembangan mockup dan alur navigasi halaman	VONI																		
	2.5 Pembuatan prototype awal (frontend dasar + simulasi fitur CRUD0	VONI																		

Tahapan Kegiatan		PIC	BULAN NOVEMBER						
			11	12	13	14	15	16	17
3. Evaluasi Prototype awal	3.1 Presentasi prototype kepada klien (pemilik Kedai Tokosai)	VONI							
	3.2 Pengumpulan umbal balik dan pencatatan revisi	VONI							
	3.3 Analisis hasil evaluasi dan identifikasi kebutuhan tambahan	VONI							

Tahapan Kegiatan		PIC	BULAN DESEMBER																		
			18	20	22	24	26	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Pengembangan & Penyempurnaan sistem	4.1 Pengembangan backend dengan PHP dan MYSQL	DELA																				
	4.2 Implemnetasi fitur CRUD menu dan keranjang transaksi	DELA																				
	4.3 Penambahan fitur pembayaran (Cash & QRIS)	DELA																				
	4.4 Implementasi laporan penjualan otomatis (Excel & PDF)	DELA																				
	4.5 Integrasi antar modul sistem	DELA																				

GANTT CHART

Tahapan Kegiatan		PIC	BULAN DESEMBER								BULAN JANUARI							
			21	22	23	24	25	26	27	28	1	3	5	6	8	9	10	
5. Implementasi Akhir & Penyerahan	5.1 Deploy website ke hosting	DELA																
	5.2 Konfigurasi database dan domain	DELA																
	5.3 Uji coba akses online	ALL																
	5.4 Penyerahan sistem final kepada klien	ALL																

Tahapan Kegiatan		PIC	BULAN JANUARI									
			12	13	14	16	18	20	21	22	24	26
6. Pelatihan & Pemeliharaan	6.1 Pelatihan penggunaan sistem bagi pemilik Kedai Tokosai	DELA										
	6.2 Pembuatan panduan teknis dan dokumentasi pengguna	ALL										
	6.3 Pemeliharaan minor dan pembaruan sistem berdasarkan kebutuhan	ALL										

PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE (PERT)



THANK YOU

